


FORMATION PRIMAVERA P6 AVANCÉ GESTION DES COÛTS

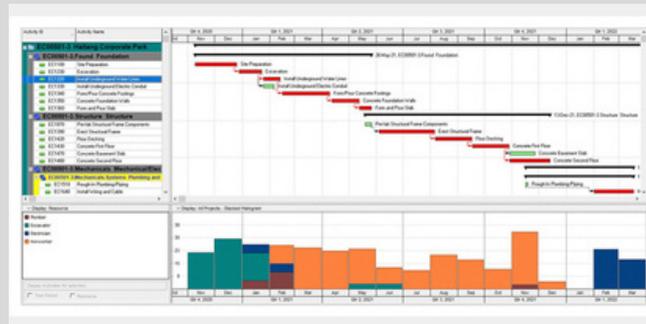

✉ contact@mesli.consulting

☎ +33 1 69 81 95 92

www.mesli-consulting.com





+33 1 69 81 95 92



contact@mesli.consulting

INFOS PRATIQUES



Durée :
1 jour - 7 heures



Dates :
Nous contacter
+33 1 69 81 95 92



Lieux :
Intra-entreprises
Massy (91)
En distanciel
(Visioconférence)



Objectifs

- Maîtriser les aspects coûts du logiciel pour une optimisation
- Redimensionnement des budgets en phase réalisation et finale du projet
- La communication l'avancement de vos projets via des indices de performance basés sur les coûts



Public

- Cette formation Primavera P6 gestion des coûts s'adresse aux chefs de projets et à toutes les personnes impliquées dans un projet de l'entreprise



Méthodes mobilisées Support pédagogique

- Chaque stagiaire se verra attribuer un PC avec l'application Primavera P6
- Tous les participants se verront remettre des supports pédagogiques en fin de formation
- Cette formation englobe une partie théorique, une analyse de cas pratique, et implique échanges et mises en situation



Nos formateurs

- Nos formations sont dispensées par des experts internationaux reconnus pour leurs compétences et leurs expertises dans la planification et la gestion de projets complexes



Acquis

- A l'issue de cette formation, chaque participant sera en mesure de gérer les coûts avec Primavera P6 et d'établir des rapports personnalisés



Pré-requis

- Il est préférable de maîtriser les fondamentaux de la gestion de projet



Modalités d'évaluation

- Évaluations des acquis via des exercices de mises en situation, auto-évaluation et fourniture d'une attestation de fin de formation





PROGRAMME DE LA FORMATION

Jour 1

Paramétrage de la base de données

- Définition des centres de frais
- Renseignement des centres de frais dans la base de données

Allocations des coûts aux tâches principales du projet

- Répartition des coûts

Personnalisation des présentations pour un planning de référence

- Consolidation des coûts par niveau hiérarchique
- WBS
- Présentations personnalisées
- Rapprochements avec les montants des contrats

Analyse de la valeur Acquisse -EVM

- Planification initiale des coûts (PlannedCost)
- Planification et évaluation réelle des valeurs (ActualCost)
- Indice de performance coûts (CPI -CostPerformance Indicator)
- Analyse de l'état d'avancement de votre projet

Formalisation du reporting

- Communication des données
- Courbes en S et export des informations sur Excel
- Solutions de personnalisation des rapports

Analyse et recommandations au chef de projet

Synthèse et conclusion

Dernier mise à jour de la plaquette : 21 décembre 2023

